



Unione dei Comuni del Terralbese
MARRUBIU • URAS • S. N. D'ARCIDANO • TERRALBA • ARBOREA
PROVINCIA DI ORISTANO

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

(art. 23, comma 4, del D.Lgs 50/2016, art. 35 c.8 L.R. 8/2018 e Linee guida n. 3 punto 5.14 lett. e) dell'ANAC)

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

“Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas”

**Adeguamento, completamento e riqualificazione del
complesso sportivo intercomunale di Via Linnaris nel
Comune San Nicolò d'Arcidano**

PT-CRP-18/INT-45 • CUP: **D99H18000460002**

Importo di finanziamento € 500.000,00



1_PREMESSE

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/41 del 22 gennaio 2019 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall'Allegato Tecnico, nonché dal Quadro finanziario dell'Accordo di programma quadro - Progetto di Sviluppo Territoriale "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e del Linas".

In data 24.01.2019 è stato sottoscritto in forma digitale l'Accordo di Programma Quadro tra Regione Autonoma della Sardegna, l'Unione di Comuni Terralbese, l'Unione di Comuni Monte Linas - Dune di Piscinas, la Provincia del Sud Sardegna, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale "Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e del Linas", reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 9 del 28.01.2019 pubblicato sul BURAS n. n. 7 del 7.02.2019.

Con Deliberazione dell'Assemblea n. 6 del 5.12.2018 l'Unione dei Comuni Monte Linas - Dune di Piscinas ha delegato l'Unione di Comuni del Terralbese come soggetto attuatore degli interventi.

In data 12.03.2019 è stata sottoscritta tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto Attuatore Unico, Unione dei Comuni del Terralbese, la Convenzione Attuativa (Rep. n.2072/Conv/13 del 12.03.2019), che disciplina le modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma Quadro.

In data 25.07.2019 è stato stipulato tra i medesimi soggetti il I atto aggiuntivo alla Convenzione che consente di dare avvio a ulteriori n. 27 interventi, tra cui :

Scheda	Titolo intervento	Localizzazione	Fonte	Azione	CUP	RUP	Importo
PT-CRP-18/INT-45	Adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso sportivo intercomunale di via Linnaris	San Nicolò d'Arcidano	Fondi regionali	Fondi regionali	D99H18000460002	Gian Luca Porcu	500.000,00

Costituisce documento di riferimento nella definizione delle azioni da intraprendere nel corso dell'iter procedurale, oltre alle convenzioni sopracitate, la scheda di intervento unitaria con allegato tecnico economico (all. A).

Con atto del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese prot. n. 4300 del 18.11.2019 lo scrivente geom. Gian Luca Porcu, dipendente dell'Unione dei Comuni del Terralbese è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la gestione del progetto in argomento.

Il progetto in argomento è individuato nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici e nell'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche 2019 approvato con Delibera Giunta dell'Unione n. 79/2019;

Nel seguito si presenta il documento denominato "Documento di indirizzo alla progettazione" (DIP), introdotto dal D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice) all'articolo 23 commi 4 e 5, come specificato dalle linee guida dell'ANAC n. 3 aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 107 del 11.10.2017, in ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze e ai bisogni da soddisfare, fissando i limiti finanziari da rispettare e indicando i possibili sistemi di realizzazione da impiegare, con riferimento all'intervento in oggetto.

Alla data odierna non è ancora stato emanato il provvedimento attuativo previsto dall'articolo 23 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, cioè il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale saranno definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, oltre che i contenuti del presente Documento di indirizzo alla progettazione.

Nelle more dell'adozione del provvedimento attuativo, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, art. 216 comma 4, i contenuti del Documento di indirizzo alla progettazione seguono quelli previsti per il documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all'articolo 15 comma 5 del D.P.R. 207/2010, come di seguito riportato.

2_ PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE

a) tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera.

a.1 contratto per l'affidamento dei servizi di ingegneria

Vista la carenza di organico dell'Ente e stante la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, non è possibile svolgere le prestazioni relative alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza internamente alla Stazione Appaltante e, pertanto, se ne prevede l'affidamento ad un soggetto esterno di cui all'art. 46 del D.Lgs.50/2016.

Verrà affidato il servizio professionale per la Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del progetto definitivo-esecutivo e la direzione lavori, misura e contabilità nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art.83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della determinazione del valore dei servizi professionali, l'importo stimato per i servizi di ingegneria, pari a circa **€ 54.511,11** cassa previdenziale e IVA escluse, si ritiene riferito alle seguenti categorie di cui al DM 17/6/2016:

CATEGORIE D'OPERA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO OPERE
Edilizia	E.11 – Padiglioni provvisori per esposizioni – Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici). Case parrocchiali, Oratori – Stabilimenti balneari – Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto. Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice.	E.11	0,95	€ 335.000,00

Per il calcolo del valore dei servizi di progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza da porre a base di gara, si è provveduto in base al D.M. 17/06/2016 come da allegato.

a.2 contratto per l'affidamento dei lavori

I lavori oggetto del presente documento di indirizzo alla progettazione saranno realizzati mediante appalto di sola esecuzione dei lavori.

L'importo complessivo netto dei lavori ammonta presuntivamente a **€ 335.000,00** comprensivo degli oneri per la sicurezza.

b) procedura che si seguirà per l'appalto

La procedura di e dei lavori sarà attuata nel rispetto del D. Lgs. 50/2016, della L.R. n. 8/2018, del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, delle linee guida di attuazione del D.lgs. 18/04/2016 n° 50 emesse dall'ANAC e ss.mm. ii. e della normativa vigente al momento delle varie fasi d'affidamento.

b.1 appalto dei servizi di progettazione

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il servizio potrà essere affidato mediante procedura negoziata, sull'applicativo SardegnaCat, previa consultazione, ove esistenti, di almeno

dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

b.2 appalto dei lavori

Per l'affidamento dei lavori, si procederà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c-bis del D.Lgs 18/04/2016 n° 50, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

L'appalto relativo ai lavori sarà affidato ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 50/2016 ponendo a base di gara il progetto definitivo-esecutivo.

c) contratto

Il contratto per l'esecuzione dei lavori potrà essere stipulato a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

d) criterio di aggiudicazione

d.1 appalto dei servizi di progettazione

Il criterio di aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

d.1 appalto dei lavori

Il criterio di aggiudicazione avverrà sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.


3_ PRECISAZIONI DI NATURA TECNICA E PRESTAZIONALE

a) Situazione iniziale

Il Complesso "Impianto sportivo intercomunale" è di proprietà comunale e edificato in un'area comunale, ubicato a San Nicolò d'Arcidano nella Via Linnaris. Lo stesso è composto dal campo sportivo da calcio con relative tribune e spogliatoi, il campo da basket/pallavolo, il campo da calcetto, il campo da tennis/beach volley, il campo da tennis, il bocciodromo e la palestra polifunzionale con campi per le attività di calcetto, pallavolo, palla tamburello e basket.



L'area interessata dall'intervento in oggetto (campo sportivo da calcio e basket) è compresa nell'area distinta al NCEU del Comune di S.N.D'Arcidano al Foglio 5 e Foglio 3 dai mappali riportati dentro la perimetrazione della seguente mappa .

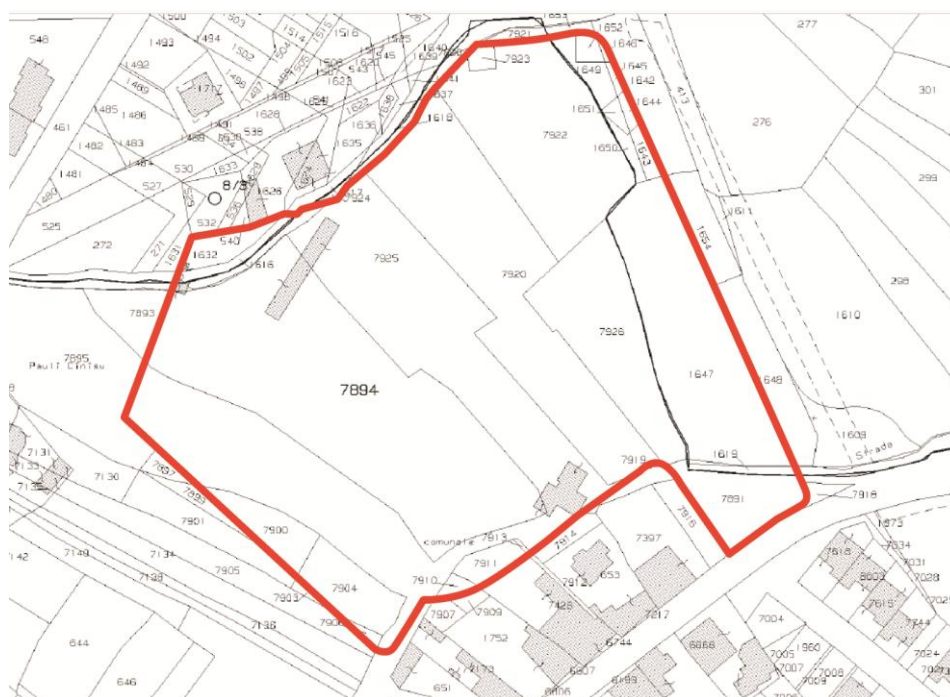

Le caratteristiche attuali dei singoli impianti sportivi che costituiscono l'intero complesso sono:

- Campo da calcio in terra con attorno pista di atletica originariamente con manto in bitume ma attualmente sfarinato, deteriorato e totalmente impraticabile, con tribune in prefabbricato cementizio e sovrastante copertura in struttura metallica e pannellatura; il campo sportivo da calcio è dotato di impianto di illuminazione composto da n. 4 torri faro e n. 2 proiettori a torre funzionanti;
- Campo da basket/pallavolo con manto in bitume ma attualmente sfarinato, deteriorato e totalmente impraticabile (canestri da sostituire sia struttura che tabellone), privo di impianto di illuminazione;
- Campo da calcetto con manto in erba sintetica adeguatamente recintato con rete metallica romboidale e sovrastante rete para palloni; il campo da calcetto è dotato di impianto di illuminazione composto da n. 4 pali e n. 4 proiettori a palo funzionanti;
- Campo da tennis/beach volley in sabbia adeguatamente recintato con rete metallica romboidale e sovrastante rete para palloni dotato di impianto di illuminazione;
- Campo da tennis con manto in bitume recintato con rete metallica romboidale; il campo da tennis è dotato di impianto di illuminazione composto da n. 4 pali e n. 2 proiettori a palo funzionanti;
- Palestra con manto campo da gioco (calcetto/basket/pallavolo/palla tamburello) in gomma, dotata di tribune, spogliatoi, servizi igienici e di impianto di illuminazione n. 14 proiettori (n. 7 per lato lungo);
- Bocciodromo in fase di adeguamento e completamento che prevederà il manto delle corsie da gioco in materiale resinoso. Attualmente sono in corso i lavori di completamento e adeguamento del bocciodromo comunale che prevedono la chiusura definitiva dell'edificio (completamento tamponatura con pannellatura in alluminio coibentato, gronde scossaline e pluviali) la realizzazione dell'impianto di illuminazione e la realizzazione delle n. 2 corsie da gioco;

Il complesso sportivo è stato di recente oggetto di interventi di ristrutturazione attraverso lavori di adeguamento e manutenzione della palestra e del campo sportivo che di seguito sommariamente si descrivono:

- Demolizione del muro di recinzione del campo sportivo da calcio adiacente la Via A. Franchi vistosamente inclinato verso la medesima via e rifacimento dello stesso con recinzione a giorno eseguita in cemento armato e sovrastante posa di pannelli in rete metallica (tipo keller) ancorati sul sottostante muretto in c.a. attraverso pilastri in paletti a T in ferro;
- Rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura del tratto di recinzione prospiciente il parcheggio antistante l'ingresso al campo sportivo lato tribune e il tratto di recinzione prospiciente l'intersezione a rotatoria direzione Uras;
- Rifacimento di un tratto della recinzione interna che delimita l'area di gioco con l'area per il pubblico fronte palestra e lato campo di pallacanestro con sostituzione del relativo cancello di accesso all'area da gioco;
- Ripristino delle parti ammalorate dell'intonaco delle pareti esterne dei locali spogliatoio con realizzazione della nuova tinteggiatura e la manutenzione della guaina impermeabile della copertura piana.
- Sostituzione di alcuni proiettori installati nelle torri faro dell'impianto di illuminazione del campo da calcio;
- Adeguamento della copertura della palestra attraverso l'installazione di pannelli grecati in alluminio ancorati sulla esistente struttura lignea al fine di sormontare l'attuale manto di copertura realizzato in tegole canadesi in gran parte mancanti e ammalorate causa di continue infiltrazioni di acqua piovana;

b) obiettivi generali da perseguire

L'obiettivo è quello di interventi di adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso sportivo, al fine di rendere funzionali tutti i singoli impianti delle diverse attività sportive, al fine di poter

ospitare anche manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale approvate dalle varie federazioni di specialità.

c) esigenze e bisogni da soddisfare

Le esigenze che l'Ente intende soddisfare con la realizzazione dell'intervento comprendono:

- a) Adeguamento, completamento e riqualificazione del complesso "Impianto sportivo intercomunale";
- a1) Adeguamento delle torri faro del campo da calcio, adeguamento delle tribune, servizi igienici e spazi per pubblico diversamente abile, vie di esodo;
- a2) Adeguamento pista di Karting all'interno dell'area attorno al campo da calcio;
- a3) Riqualificazione campo di basket/pallavolo;
- a4) Adeguamento e riqualificazione energetica della palestra comunale mediante la sostituzione dei fari di illuminazione alimentati da impianto fotovoltaico;
- a5) Completamento del bocciodromo con la realizzazione dei servizi igienici e delle tribune;
- a6) Adeguamento impianti elettrici e di illuminazione con sistema a Led, realizzazione spogliatoi e servizi igienici (campo da calcetto, campo tennis/beach volley e campo tennis).

d) regole e norme tecniche da rispettare

Il progetto dell'intervento dovrà essere redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, delle norme tecniche generali, nonché delle normative vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, del dimensionamento dell'impiantistica e delle norme tecniche per le costruzioni.

In via non esaustiva si possono richiamare:

- d.1) Norme Urbanistiche e Ambientali:
 - Norme Tecniche di Attuazione collegate al P.U.C., nonché il relativo Regolamento Edilizio;
 - D.M. 11 ottobre 2017, recante Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
- d.2) Norme di sicurezza:
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d.3) Norme tecniche:
 - Decreto 17/01/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°42 del 20/02/18 recante "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni".
 - Norme UNI
 - Norme CEI
- d.4) Norme Amministrative :
 - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici;
 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto per quanto ancora applicabile;
 - DM 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
 - L.R. 13 marzo 2018, n. 8 recante Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», in attuazione dell'art. 111, comma 1, del Codice;


e) vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto

L'attività di progettazione dovrà essere sviluppata nel rispetto dei limiti di spesa prestabiliti; dovrà inoltre avere come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità, tecnicamente valido,

nel rispetto del miglior rapporto tra i benefici ed i costi globali connessi all'intera vita dell'opera in modo da garantire la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative nonché il pieno rispetto delle normative di settore.

Il progetto dovrà evidenziare, in rapporto agli interventi progettati, la compatibilità con la vigente disciplina del Piano Urbanistico Comunale e della Pianificazione sovra ordinata.

e.1 Vincoli edilizi - urbanistici Nel caso in specie l'edificio ricade in zona territoriale Omogenea S3 - S4 - Servizi Pubblici, come si evince dalla seguente immagine estratta dalla tav. 9* del PUC vigente di San Nicolò d'Arcidano.

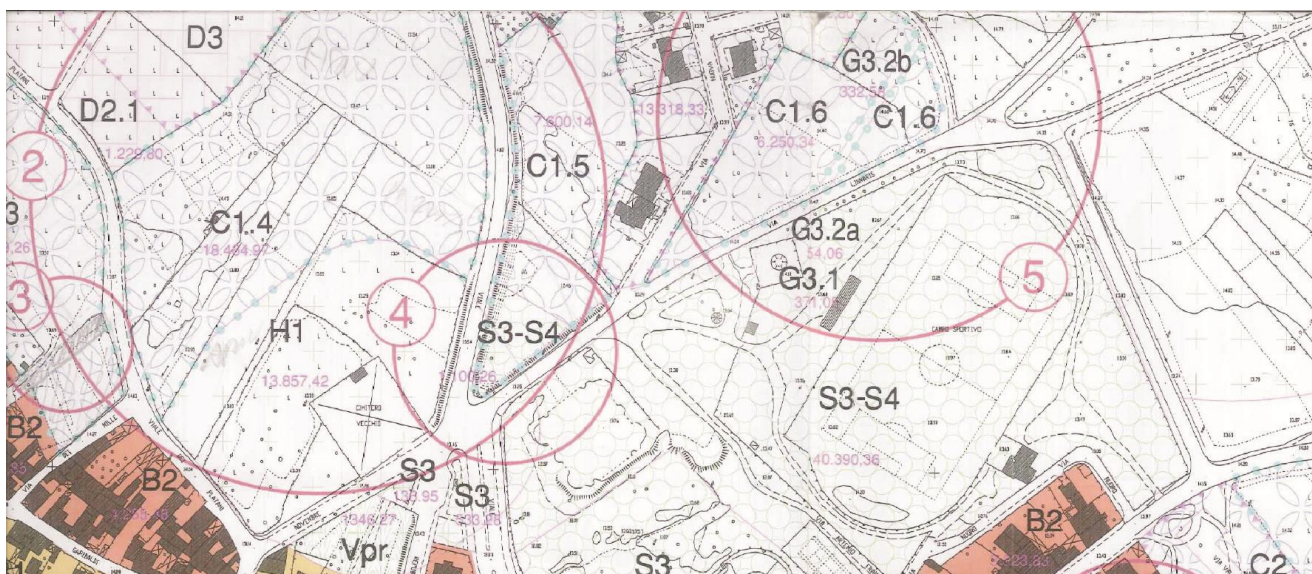

e.2 Vincoli PAI L'area in cui insiste l'intervento non è interessata dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Autonoma della Sardegna (Bacino 2 Tirso), né dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali PSFF 2015.

e.3 Vincoli beni Paesaggistici Regionali

Sull'area su cui insiste l'intervento non esistono vincoli paesaggistici.

f) requisiti tecnici

Nella predisposizione degli elaborati dovrà tenersi conto delle seguenti indicazioni:

- gli schemi grafici dovranno contenere gli elementi necessari per la puntuale definizione delle opere ed il facile e corretto riscontro delle quantità previste in progetto;
- le modalità esecutive e le caratteristiche dei materiali da costruzione dovranno essere puntualmente illustrate negli elaborati grafici e relazionali nonché nel capitolato d'appalto;

Nelle fasi di progetto dovranno essere consultati gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla-osta di legge al fine di condividere le esigenze e gli obiettivi previsti.

Il Capitolato Speciale di Appalto deve contenere, oltre gli aspetti tecnici relativi ai modi di esecuzione di ogni categoria di lavoro e dei relativi materiali impiegati, la puntuale disciplina amministrativa dell'appalto.

Essa prevede la specifica disciplina che riguardi almeno i seguenti argomenti:

- l'ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori;
- modalità di stipula del contratto;
- documenti che fanno parte del contratto;
- ispezioni nel cantiere e dei lavori;
- rappresentanza dell'impresa nel cantiere, requisiti e competenze del direttore del cantiere;
- termini per l'esecuzione dei lavori;

- penali in caso di ritardo;
- casi e modalità di risoluzione del contratto;
- anticipazioni e pagamenti in acconto;
- pagamenti a saldo;
- cauzioni, garanzie e coperture assicurative;
- variazioni al progetto e modifiche contrattuali ammissibili;
- disposizioni in materia di sicurezza;
- disciplina dell'avvalimento e del subappalto;
- disposizioni in materia di lavoratori;
- disposizioni specifiche in materia di controversie e riserve;
- ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione;
- oneri e obblighi a carico dell'appaltatore anche con riguardo ai termini entro il quale devono essere resi gli elaborati del progetto esecutivo aggiornati allo stato di effettiva costruzione, nonché tutta la documentazione e le certificazioni a supporto.

Con riguardo ai pagamenti in acconto il Capitolato Speciale d'Appalto specifica la soglia di credito che l'impresa deve maturare, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, per aver diritto al pagamento in acconto. L'importo della soglia deve essere proporzionato all'ordinaria capacità economica attesa dalle imprese che, secondo la vigente disciplina sui contratti pubblici, possono avere accesso alla gara per l'affidamento dei lavori. Di norma il valore della soglia non è superiore ad un quarto del valore complessivo dei lavori.

Le specifiche tecniche dei componenti devono tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi.

g) impatti dell'opera sulle componenti ambientali

In questa fase preliminare alla redazione del progetto, non emergono particolari impatti dell'opera sulle componenti ambientali.

h) fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento

L'affidamento della progettazione riguarderà le seguenti principali attività:

- studio di fattibilità tecnico-economica;
- progettazione definitiva – esecutiva;
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Direzione lavori, misura e contabilità;
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- emissione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ossia l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

Operativamente potranno essere condotti a discrezione motivata del soggetto incaricato della progettazione: rilievi geometrici di dettaglio degli elementi strutturali, indagini sui materiali, sui dettagli costruttivi, prove di carico, ecc.. L'esito delle stesse, valutato mediante apposita relazione, escluderà o rileverà la necessità di ulteriori interventi strutturali risolutivi delle eventuali criticità emerse ovvero. Al tecnico incaricato compete la preliminare valutazione e stima delle somme necessarie per le indagini e prove che verranno inserite nel quadro economico tra le somme a disposizione della SA che ne seguirà l'affidamento.

I tempi previsti per la redazione del progetto sono:

- | | |
|---|-----------|
| - Progetto di fattibilità tecnico economica | 20 giorni |
| - Progetto definitivo | 45 giorni |
| - Progetto esecutivo | 20 giorni |

i) livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere

Sono richiesti i seguenti elaborati progettuali che dovranno essere redatti in conformità agli articoli di cui alle sezioni II e IV del Capo I, Titolo II, Parte II del DPR 207/2010 che, per effetto degli artt. 23, comma 3, e 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016, contiene la disciplina sulla progettazione dei lavori pubblici).

Documenti componenti il progetto di fattibilità tecnico economica

- a) Relazioni, planimetrie, elaborati grafici;
- b) Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto;
- e) Piano economico e finanziario di massima;
- f) Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982);
- g) Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza;
- d) Studi di prefattibilità ambientale (art. 17, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010).

Documenti componenti il progetto definitivo

- a) Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
- b) Rilievi dei manufatti;
- c) Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
- d) Relazione geotecnica;
- e) Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982);
- f) Elaborati e relazioni per requisiti acustici (L. 447/95 – DPCM 512/97);
- g) Relazione energetica (ex legge 10/91 smi).

Documenti componenti il progetto esecutivo

- a) Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;;
- b) Particolari costruttivi e decorativi;
- c) Computo metrico estimativo, Quadro Economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- d) Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto, Cronoprogramma;
- e) Piano di manutenzione dell'opera;
- f) Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Ai sensi della vigente normativa si valuta di integrare il Piano di manutenzione con le prescrizioni di cui al "fascicolo" dell'opera, da redigere in conformità all'allegato XVI del d.lgs 81/2008 e s.m.i. dal coordinatore in fase di progettazione.

Vista la natura e la limitata entità dell'opera, il Manuale d'uso, il Manuale di manutenzione ed il Programma di manutenzione potranno eventualmente essere riuniti in un unico documento, beninteso conservando i contenuti minimi di cui alla vigente normativa.

Il Direttore dei lavori ed il Coordinatore in fase esecutiva, ciascuno per la propria competenza, provvederanno infine ad aggiornare ed adeguare i suddetti contenuti e documenti in base alle opere effettivamente realizzate, ai sensi di cui alla vigente normativa.

Modalità di redazione del progetto

La progettazione deve essere improntata ai seguenti criteri.

Organizzazione delle informazioni

Gli elaborati progettuali devono essere studiati, ai livelli di dettaglio coerenti con la specifica fase progettuale, in modo tale che le informazioni siano univoche e rintracciabili, specifiche, esaustive, rispettose della libera concorrenza, prodotte in documenti unitari.

Univocità e rintracciabilità

Ogni elemento, componente o materiale, considerato nel progetto deve essere univocamente individuato, onde consentirne la inequivocabile rintracciabilità nei differenti elaborati, preferibilmente

attraverso un codice che lo riconduca agevolmente dalla tavola grafica alla descrizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle modalità di posa in opera, al prezzo unitario, al computo metrico e alla stima del costo, alle relazioni di calcolo, al capitolato speciale d'appalto.

Specificità

Gli elaborati devono contenere soltanto le informazioni relative al progetto a cui si riferisce l'incarico.

Esaustività

Ciascun elemento, componente e materiale considerati nel progetto deve essere individuato attraverso le seguenti caratteristiche:

- ☐geometriche, morfologiche e dimensionali (elaborazione grafica);
- ☐tecniche e prestazionali (capitolato, relazioni di calcolo, relazioni di analisi e valutazione delle opzioni proposte in ordine alle specifiche discipline interessate)
- ☐manutentive (documenti del piano di manutenzione);
- ☐di sicurezza (documenti del piano di sicurezza e coordinamento);
- ☐economiche (computi metrici, elenchi e analisi dei prezzi, stime dei costi di investimento e dei loro riflessi sui corrispondenti costi di gestione a regime, ...).

Concorrenza

Le voci descrittive degli elementi tecnici devono consentire di individuare sul mercato più prodotti in grado di soddisfare le prestazioni richieste. La denominazione di prodotti commerciali è pertanto ammessa soltanto se ritenuta utile a titolo esemplificativo ed accompagnata dalla dicitura "o equivalente". Tale possibilità non esime l'affidatario dall'obbligo di fornire la precisa descrizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali richieste, in quanto indispensabile per la scelta di prodotti equivalenti.

Unicità dei documenti

Ciascun documento (es.: relazione, computo metrico estimativo, capitolato speciale di appalto, ...) deve considerare tutti gli apporti generali e specialistici implicati ed avere un solo indice.

Nel caso in cui la quantità di pagine sia tale da richiedere la rilegatura in più fascicoli, la numerazione delle pagine di questi ultimi deve essere progressiva e riferita all'unico indice.

Unitarietà del progetto e coordinamento fra specializzazioni

Il progetto deve costituire, nei contenuti e nella forma, la risultante organica del coordinamento di più discipline specialistiche. In ordine ai contenuti, le informazioni dei differenti elaborati del progetto devono essere coerenti tra loro e con le altre opzioni progettuali ad esse collegate.

Circa la forma, i documenti progettuali devono essere redatti in modo omogeneo evitando il mero assemblaggio di contributi eterogenei (criteri, modalità e/o software diversi, ridondanze o difficoltà di raffronto tra elaborati, ...).

Deve essere dimostrata, al livello di dettaglio rispondente alla fase progettuale, la fattibilità delle proposte anche sotto l'aspetto della reciproca compatibilità tra impianti, strutture e opere edilizie.

Rispetto delle esigenze

Il progetto è considerato completo e conforme se risponde alle esigenze della stazione appaltante espresse nel presente documento.

Il coinvolgimento della stazione appaltante, nell'elaborazione progettuale, è considerato indispensabile

anche ai fini della sistematica verifica di rispondenza delle specifiche opzioni proposte alle indicazioni della Relazione di Indirizzo alla Progettazione di una, se necessaria, specificazione di queste ultime.

Conformità normativa

Il progetto deve risultare conforme in ogni sua parte alle disposizioni di legge ed agli atti amministrativi emanati per la loro applicazione, intendendosi le fonti normative richiamate in questo documento indicative e non esaustive.

Nel dubbio delle fonti giuridiche da utilizzare (es.: in merito a prescrizioni, metodi di calcolo o di verifica, altri aspetti applicativi, ...) e delle norme tecniche da applicare alle componenti di maggior rilievo, l'affidatario deve preventivamente concordarle con il responsabile unico del procedimento (RUP).

Le norme tecniche devono essere individuate preferibilmente in ambito europeo (norme EN).

In carenza di tali riferimenti o in funzione di elevati standard qualitativi dell'opera, l'affidatario può motivatamente proporre riferimenti tecnici di altri paesi o di associazioni di categoria (norme DIN, NF, SIA, ASTM, ASHRAE, codici di buona pratica, ...).

L'entrata in vigore di norme giuridiche o la formalizzazione di norme tecniche che modificano, nel corso della progettazione, quelle individuate nel piano di sviluppo del progetto comportano la corrispondente modificazione di queste ultime, in modo tale che il progetto risulti conforme alle norme giuridiche ed a quelle tecniche vigenti al momento della sua consegna all'Amministrazione appaltante.

Conformità ai vincoli autorizzativi

L'affidatario deve garantire la rispondenza del progetto alle prescrizioni e indicazioni ricevute, in fase interlocutoria, dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni di legge e quindi:

- a) redigere, nei tempi e nei modi stabiliti da ciascun ente, la documentazione occorrente per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie al compimento dell'opera;
- b) rapportarsi con gli enti (singolarmente o attraverso la predisposizione di quanto necessario all'indizione della conferenza dei servizi) ed uniformarsi alle loro indicazioni sin dalle fasi iniziali della progettazione, apportare al progetto le modifiche o integrazioni da essi richieste, senza che questo comporti slittamenti o ritardi nei tempi di consegna contrattualmente stabiliti.

Riduzione del rischio di imprevisti

Il progetto deve essere sviluppato in modo da minimizzare il rischio di imprevisti in tutte le fasi del ciclo dell'opera (dalla progettazione al collaudo) e, in tal senso, all'Affidatario compete l'onere di effettuare: i rilievi e le analisi di definizione dello stato di fatto; le verifiche e gli accertamenti propedeutici alla osservanza dei vincoli individuati.

I rilievi e le analisi propedeutici alla progettazione devono documentare:

- dimensioni e geometria dell'area, confini di proprietà e relativi accertamenti catastali;
- vincoli alla configurazione dell'edificio (es.: distanze dai confini, altezza max,...) imposti, oltre che dalle norme urbanistiche, dalla conformazione dell'area e da eventuali zone di rispetto.

L'affidatario è tenuto ad effettuare - con tutti gli Enti la cui giurisdizione interagisce con il progetto le verifiche necessarie ad assicurare il rispetto dei vincoli di legge e l'eliminazione del rischio di imprevisti per carenti valutazioni. Il progetto deve essere conforme ai vincoli rilevati.

Cartiglio

L'affidatario si impegna a definire in accordo con il RUP il cartiglio da utilizzare. Esso deve contenere almeno le seguenti informazioni: denominazione e logo di Regione, Comune e committente; oggetto del progetto e codice unico di progetto (CUP); ambito e tipo di rappresentazione; scala del disegno; progettisti e consulenti costituenti il gruppo di progettazione e relativi ruoli; indice dello stato di revisione dell'elaborato, da aggiornare ogni qualvolta esso è modificato e che lo rende inequivocabilmente rintracciabile rispetto a versioni precedentemente consegnate, compresa la prima emissione ed a modifiche successive.

Formato degli elaborati e scala di rappresentazione

I formati ammessi sono esclusivamente UNI da A0 ad A4.

Gli elaborati grafici devono essere esclusivamente redatti nelle scale di rappresentazione adeguata 1:1000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 e le relative tavole devono essere ripiegate in formato A4.

La documentazione prodotta in formato A3 deve essere raccolta per tema e rilegata in album. I documenti non grafici (relazioni tecniche, specialistiche e di calcolo, capitolati speciali, elenchi prezzi, computi metrici, ...) devono essere prodotti in formato A4, avere cartoncino al fondo, pinzatura in alto a sinistra, pagine numerate in modo progressivo, indice con i riferimenti di pagina.

Il tutto deve essere prodotto in n. 3 copie che andranno fornite alla stazione appaltante.

Il progettista si impegnerà a fornire alla stazione appaltante altre eventuali copie qualora sia ritenuto necessario dalla stessa. Sarà cura del progettista fornire anche i file dwg/word/pdf.

Verifica del progetto

I progetti sono sottoposti per l'approvazione dell'Amministrazione appaltante a verifica – in corso di elaborazione ed alla loro conclusione. La verifica nel caso di specie potrà essere effettuata dal RUP

ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d) del D.Lgs n. 50/2016. L'affidatario non può modificare elaborati progettuali già verificati senza il formale e motivato assenso del RUP.

l) limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento

Nell'atto aggiuntivo alla Convenzione Attuativa (Rep. n.2072/Conv/13 del 12.03.2019), stipulato in data 25.07.2019, tra gli interventi finanziati è compresa l'ampliamento della struttura residenziale integrata per anziani.

L'importo di € **500.000,00** risulta dunque essere il limite finanziario da rispettare. Tenuto conto dei costi per esecuzione lavori, progettazione, I.V.A. etc. si desume il seguente quadro economico:

A1)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (a corpo)	€.	330.000,00
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA	€.	5.000,00
A (A1 + A2)	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€.	335.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	IVA SUI LAVORI (22% DI A)	€.	73.700,00
B2)	INCENTIVO LR 5/2007 (2% DI A)	€.	6.700,00
B3)	FONDO ACCORDO BONARI	€.	10.050,00
B4)	SPESE TECNICHE	€.	54.511,11
B5)	CASSA 4% E IVA 22% SU SPESE TECNICHE	€.	14.652,58
B6)	PARERI ENTI TERZI	€.	300,00
B7)	CONTRIBUTO AUTORITÀ	€.	150,00
B8)	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€.	4.936,31
B	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€.	165.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO (A + B)		€.	500.000,00

La stima dei costi concorrenti alla realizzazione delle opere andrà valutata secondo le normative vigenti e il prezzario della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 19/39 del 17/04/2018.

m) possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

I sistemi di realizzazione da impiegare dovranno essere proposti dal progettista sulla base dei risultati degli studi specialistici, indagini, verifiche, sondaggi, misurazioni, nonché dovranno recepire tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione delle opere.

n) crono programma procedurale

Tenuto conto che il I atto aggiuntivo alla Convenzione Attuativa è stato stipulato in data 25.07.2019, che la nomina del R.U.P. è stata formalizzata in data 18.11.2019 e che con la nota prot. 4461 del 28.11.2019 si è inviata la Convenzione alla RAS Ass. LLPP con il cronoprogramma aggiornato come segue rispetto a quello contenuto nella scheda unitaria d'intervento:

Iter procedurale	Data inizio effettiva o prevista	Data fine prevista	Mesi
Progettazione			
Studio di Fattibilità – Definitiva – Esecutiva			
D.L – Contabilità Lavori – Coord. Sicurezza			
Indizione procedura	01/12/2019	31/12/2019	1
Aggiudicazione	01/01/2020	28/02/2020	2
Elaborazione e approvazione	01/03/2020	31/06/2020	4

Realizzazione Lavori			
Procedura di gara - Indizione	01/07/2020	31/07/2020	1
Procedura di gara – Aggiudicazione	01/08/2020	30/09/2020	2
Adozione impegno – Stipulazione Contratto	01/10/2019	31/12/2020	3
Esecuzione – Inizio Lavori	01/01/2021	31/12/2021	12
Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (CRE)	01/01/2022	31/03/2022	3
Funzionalità	01/04/2022	30/04/2022	1

Tempi di realizzazione	MESI 29
------------------------	---------

o) crono programma economico-finanziario

22. Costo totale	€ 500.000,00				
23. Copertura finanziaria	Descrizione della fonte		Importo in Euro		
	FSC 2014-2020 – Lda 1.10.04		500.000,00		
	Totale		500.000,00		
24. Cronoprogramma finanziario		2019	2020	2021	Totale
	Previsione di spesa - soggetto attuatore	20.000,00	430.000,00	50.000,00	500.000,00
	Esigibilità - compilazione a cura del CRP				500.000,00

S.N.D'Arcidano, 31.12.2019

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Gian Luca Porcu
